nordelle

Dossier de décision, plateforme d'échange de fichiers avec les partenaires

Remplacement de la passerelle d'échange de fichiers avec les partenaires.
Demande de décision au comité de pilotage SI

Projet	Remplacement de la passerelle d'échange de fichiers (MFT)
Référence	DEC-MFT-001
Version et statut	0.3, en relecture
Rédacteur	Chef de projet MFT
Méthode	Rédigé avec l'aide d'une IA ; tous les montants sont produits par `chiffrage.mjs` ; relecture humaine requise
Destinataires	Comité de pilotage des systèmes d'information (COPIL SI)
Instance et date de décision	COPIL SI, date à fixer (S0)
Répond à	Expression de besoins EB-MFT-2026-01, version 1.2, direction des opérations
Documents liés	Chiffrage CST-MFT-001 (annexe A), registre RAID-MFT, DAT-MFT-001 à rédiger
Sensibilité	Interne

Exemple fictif qui illustre les gabarits decision-dossier et cost-estimate de Tiger Team. La société, les partenaires, les montants et les devis sont inventés. Rédigé avec l'aide d'une IA ; relecture humaine requise avant toute diffusion.

0 Suivi du document

Version	Date	Auteur	Modifications
0.1	2026-10-20	Chef de projet	Premier jet
0.2	2026-10-30	Chef de projet	Options chiffrées avec une base de capacité unique
0.3	2026-11-06	Chef de projet	Revue de cohérence, annexe de chiffrage

Notation : [F] fait sourcé, [I] déduction ou choix de conception, [AV] à vérifier. Montants en k€ HT. Les semaines sont comptées à partir de la décision (S0) ; S6 désigne la fin de la sixième semaine après la décision.

1 Décision demandée

N°	Décision	Engagé maintenant	Non engagé
1	Retenir l'option A, plateforme MFT gérée hébergée dans l'UE, et lancer la préparation, le socle et le pilote (S1 à S16)	99,2 k€ HT de décaissé (74,4 à 133,9) et 47,7 k€ de temps interne valorisé	Migration et décommissionnement, 67,4 k€ HT de décaissé, soumis à la décision de go migration en S16
2	Autoriser le dépôt des demandes d'ouverture de flux dès S1, avant la levée des conditions suspensives	Temps interne uniquement	
3	Approuver les critères de go migration de la section 5		

Le support de l'éditeur de la passerelle actuelle s'arrête 46 semaines après la date visée pour la décision [AV] (confirmation écrite demandée, Q3). Le planning laisse 8 semaines de marge. Chaque semaine de retard de la décision consomme cette marge ; au-delà, un support étendu coûterait 35 k€ HT pour un an (devis fictif).

2 Le besoin

La direction des opérations échange chaque jour des fichiers avec 140 partenaires : fournisseurs, transporteurs et banques. La passerelle actuelle arrive en fin de support, ne transmet aucune alerte au SIEM et impose une rotation manuelle des clés. L'expression de besoins EB-MFT-2026-01 demande huit exigences impératives et deux souhaitables (section 10). Hors périmètre : les échanges internes entre applications, qui restent sur le bus existant. Sans décision, la passerelle fonctionne sans correctif de sécurité après S46 [I].

3 Options

Option	Contenu	Décaissé engagé maintenant	Coût complet sur 3 ans	Exigences impératives couvertes	Risque principal	Réversibilité
A, recommandée	Plateforme MFT gérée (SaaS, UE), agent interne, migration en 3 vagues	99,2	498,8 (374,1 à 673,4)	7 sur 8, 1 partielle	Lenteur des partenaires à échanger leurs certificats	Moyenne, clause de réversibilité
B	Montée de version du produit actuel sur site	229,9	525,7 (394,3 à 709,7)	6 sur 8, 2 partielles	Charge interne et une seule instance	Élevée
0. Report d'un an	Support étendu de la passerelle actuelle	35,0	non comparable, le remplacement reste à faire	5 sur 8, 2 partielles, 1 non couverte	Aucune alerte de sécurité vers le SIEM	Élevée

Critère	Poids	A	B	0
Couverture des exigences impératives	30 %	5	4	2
Risque résiduel après mesures	25 %	4	3	1
Coût complet sur 3 ans	20 %	4	3	4
Délai de mise en service	10 %	4	3	1
Réversibilité	5 %	3	4	5
Exploitabilité, charge de run	10 %	4	2	2
Score pondéré		**4,25**	**3,25**	**2,20**

Les poids ont été validés par le sponsor avant la notation. Les trois options sont chiffrées avec les mêmes paramètres (annexe A, section A.1).

4 Recommandation


Nous recommandons l'option A. Elle couvre sept exigences impératives sur huit, la huitième (conservation des journaux pendant un an) passant par le SIEM. Elle engage 99,2 k€ HT avant la preuve du pilote, contre 229,9 k€ HT pour l'option B, dont la licence se paie dès le départ. Sur trois ans, son coût complet est inférieur de 26,9 k€ à celui de B, car l'exploitation demande 0,4 ETP au lieu de 0,7. Le décaissé net des coûts évités est équivalent : 235,6 k€ pour A et 236,0 k€ pour B. Un échec du pilote en S16 ramènerait vers l'option B, avec 99,2 k€ HT engagés.

5 Trajectoire en semaines après la décision

Phase	Semaines	Contenu	Critère de sortie ou décision	Décaissé HT
Préparation	S1–S6	Contrats SaaS et intégrateur, analyse de risque, avis du DPO, demandes de flux	Conditions suspensives C1 à C3 levées	23,5
Socle et pilote	S7–S16	Configuration, agent interne, raccordement au SIEM, test d'intrusion, dix partenaires pilotes	Décision de go migration : dix partenaires en production pendant deux semaines sans incident majeur, aucune vulnérabilité critique ouverte	75,7
Migration des partenaires	S17–S34	130 partenaires en trois vagues de six semaines	140 partenaires sur la nouvelle plateforme	60,5
Décommissionnement	S35–S38	Arrêt de l'ancienne passerelle, archivage des journaux, destruction des clés	Ancienne passerelle arrêtée avant S46	6,9
Exploitation	à partir de S39	Abonnement, support de l'intégrateur, 0,4 ETP interne		48,0 par an

Planning directeur, en semaines à partir de la décision

Étape et semaines après la décision	
Avant la décision	
Réponses aux questions Q1 à Q4	avant la décision
Décision de lancement	S0
Préparation	
Contrats SaaS et intégrateur	S1–S6
Analyse de risque et avis du DPO	S2–S5
Ouvertures de flux réseau	S2–S8
Conditions suspensives levées	S6
Socle et pilote	
Configuration, agent interne, SIEM	S7–S12
Test d'intrusion de la plateforme	S12–S13
Dix partenaires pilotes	S13–S16
Décision de go migration	S16
Migration des partenaires	
Échange des certificats avec les partenaires	S13–S30
Vague 1, 40 partenaires	S17–S22
Vague 2, 45 partenaires	S23–S28
Vague 3, 45 partenaires	S29–S34
Décommissionnement et exploitation	
Arrêt de l'ancienne passerelle	S35–S38
Exploitation courante	S39–S52
Fin du support de l'ancienne passerelle	S46

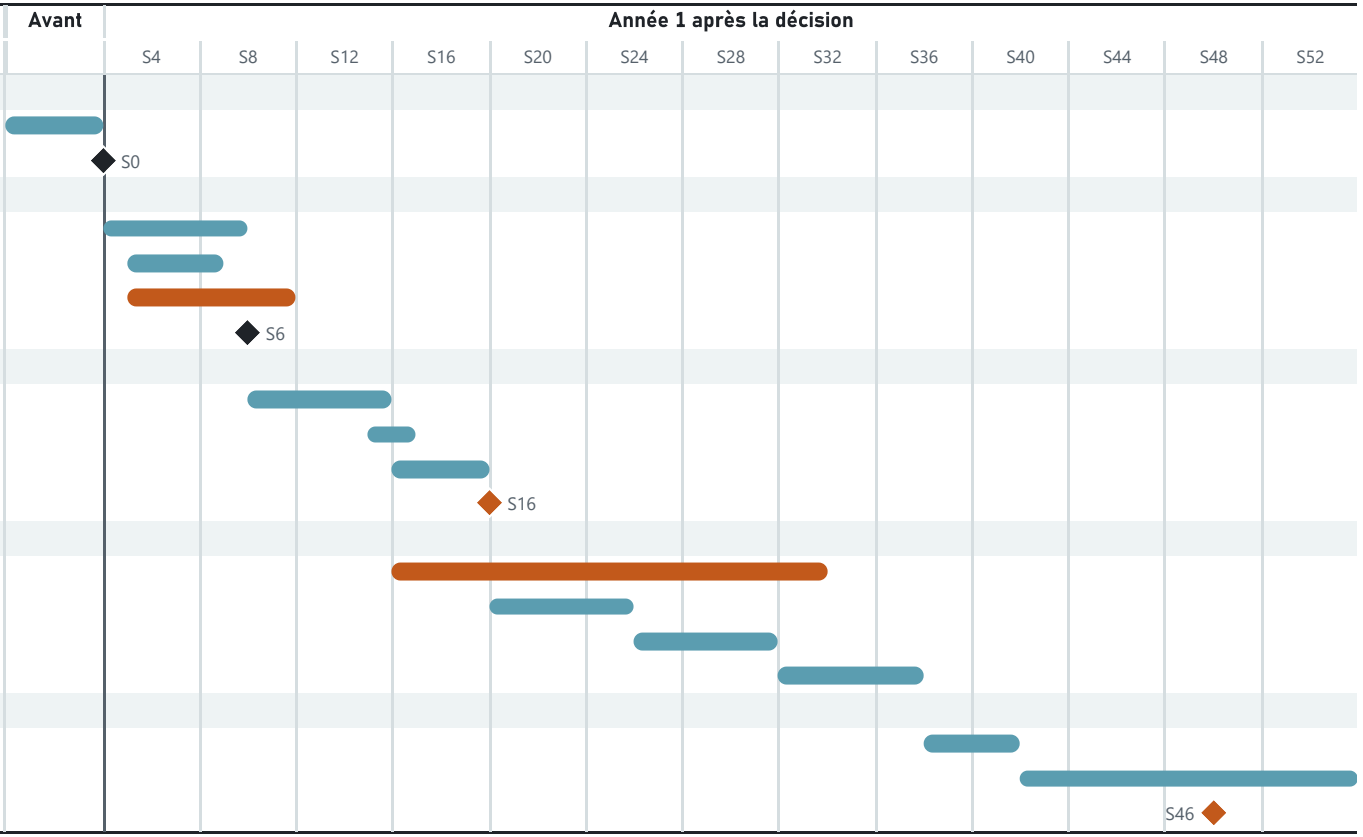

Étape · Chemin critique · Décision ou jalon · S0 : la décision. S4, S8 : fin de la 4e et de la 8e semaine.

Le chemin critique passe par les ouvertures de flux puis par l'échange des certificats avec les partenaires. La fin du support de l'ancienne passerelle (S46) laisse 8 semaines de marge après son arrêt.

6 Coûts

Synthèse du chiffrage CST-MFT-001 (annexe A). Les montants sont repris tels que produits par `chiffrage.mjs`.

Paramètre	Valeur
Base de capacité	209 jours ouvrés par ETP et par an × 80 % de disponibilité = 167,2 jours productifs
Coût d'une journée interne	88 k€ chargés ÷ 209 jours = 421 €
Prestation (TJM HT)	Intégrateur 720 €, expert de l'éditeur 1 050 €
Précision à ce stade	-25 % / +35 % sur les totaux

Option A, k€ HT	Année 1	Année 2	Année 3	Total sur 3 ans (fourchette)
Décaissé	205,4	48,0	48,0	301,4 (226,0 à 406,9)
Temps interne valorisé	127,0	35,2	35,2	197,4
Coût complet	332,4	83,2	83,2	498,8 (374,1 à 673,4)
Décaissé évité (ancienne passerelle)	7,8	29,0	29,0	65,8

Les années courent à partir de la décision : l'année 1 va de S1 à S52. Trois leviers d'économie sont détaillés en annexe A.6 ; le principal, un renfort interne pendant la migration, réduirait le décaissé de 60,5 k€.

7 Conditions du go

N°	Condition	Type	Responsable	Échéance	Statut
C1	Avis favorable du RSSI sur l'analyse de risque du service SaaS	Suspensive	RSSI	S5	Ouverte
C2	Clauses de réversibilité et de localisation dans l'UE signées	Suspensive	Achats et juridique	S6	Ouverte
C3	Avis du DPO sur les fichiers contenant des données personnelles	Suspensive	DPO	S5	Ouverte
C4	Critères de go migration approuvés (section 5)	Avant la décision	Sponsor	S0	Ouverte
C5	Partenaires de la vague 1 engagés sur l'échange des certificats	Avant le go migration	Responsable des échanges partenaires	S14	Ouverte

8 Risques

ID	Risque (cause → événement → conséquence)	Criticité	Réponse	Responsable
RSK-012	Partenaires lents à échanger leurs certificats → vagues retardées → arrêt de l'ancienne passerelle après S46	Élevée	Campagne d'échange dès S12, double fonctionnement jusqu'à S38, support étendu en repli	Responsable des échanges partenaires
RSK-014	Ouvertures de flux tardives → pilote décalé	Élevée	Demandes déposées en S1 (décision 2), suivi hebdomadaire	Infrastructure
RSK-021	Charge interne à 97 % pendant la migration → retard des vagues	Élevée	Renfort interne (levier A.6) ou vague 3 décalée de quatre semaines	Chef de projet
RSK-017	Indisponibilité du service SaaS → échanges bloqués	Moyenne	Engagement de disponibilité de 99,9 %, file d'attente de 72 h sur l'agent interne	Exploitation
RSK-019	Dépendance à l'éditeur SaaS → coût de sortie élevé	Moyenne	Clause de réversibilité, export trimestriel des configurations	Achats

9 Questions à lever

N°	Question	Ce que la réponse change	Qui répond	Nécessaire avant
Q1	Le pic de 9 000 fichiers par jour inclut-il la clôture annuelle ?	Palier d'abonnement de l'option A	Direction des opérations	La décision
Q2	Des fichiers de paie passent-ils par la passerelle ?	Avis du DPO (C3) et sensibilité des journaux	Direction des ressources humaines	La décision
Q3	La fin du support en S46 est-elle confirmée par écrit par l'éditeur ?	Marge du planning et urgence de la décision	Achats	La décision
Q4	Le SIEM accepte-t-il le format de journaux de la plateforme ?	Couverture de EB-05 et EB-10	SOC	S7

10 Correspondance avec l'expression de besoins

Exigence	Libellé court	Priorité	Option A	Option B	Option 0	Où c'est traité
EB-01	SFTP et AS2 avec les partenaires	Impérative	Oui	Oui	Oui	Section 5
EB-02	140 partenaires, 9 000 fichiers par jour en pointe	Impérative	Oui	Oui	Oui	Q1
EB-03	Chiffrement en transit et au repos, rotation des clés	Impérative	Oui	Oui	Partielle	DAT à venir
EB-04	Accusés de réception AS2 et preuve de dépôt	Impérative	Oui	Oui	Oui	DAT à venir
EB-05	Alertes vers le SIEM	Impérative	Oui	Partielle	Non	Q4
EB-06	Disponibilité de 99,5 % en heures ouvrées, RPO de 15 min	Impérative	Oui	Partielle	Partielle	RSK-017
EB-07	Hébergement dans l'UE, réversibilité	Impérative	Oui	Oui	Oui	C2
EB-08	API pour l'ERP	Souhaitable	Oui	Non	Non	DAT à venir
EB-09	Portail d'enrôlement des partenaires	Souhaitable	Oui	Non	Non	Section 5
EB-10	Conservation des journaux pendant un an	Impérative	Partielle	Oui	Oui	Q4, 90 jours natifs puis SIEM

11 Prochaines étapes

Action	Responsable	Échéance	Dépend de
Obtenir la confirmation écrite de la fin du support	Achats	Avant la décision	
Répondre aux questions Q1, Q2 et Q4	Chef de projet	Avant la décision	
Présenter le dossier au COPIL SI	Sponsor	S0	Q1 à Q3
Déposer les demandes d'ouverture de flux	Infrastructure	S1	Décision 2
Lancer l'analyse de risque du service SaaS	RSSI	S1	Décision 1

Annexe A. Chiffrage CST-MFT-001

Produit par `chiffrage.mjs` à partir des paramètres A.1. Stade : cadrage, précision -25 % / +35 %.

A.1 Paramètres

ID	Paramètre	Valeur	Source
P1	Jours ouvrés par ETP et par an	209	RH, accord d'entreprise fictif
P2	Disponibilité pour le projet	80 %	Équipe MFT, hors run et support
P3	Jours productifs par ETP et par an	167,2 (P1 × P2)	Calculé
P4	Coût annuel chargé d'un ETP interne	88 k€	Contrôle de gestion
P5	Coût d'une journée interne	421 € (P4 ÷ P1)	Calculé
P6	TJM HT	Intégrateur 720 €, expert de l'éditeur 1 050 €	Contrat cadre, devis fictif
P7	Pilotage	12 % de l'effort	Playbook PM
P9	Fourchette	-25 % / +35 %	Stade cadrage
P10	Années	Année 1 = S1 à S52 après la décision	

A.2 Charge interne et capacité, option A

Deux ETP internes sont affectés au projet.

Phase	Semaines	Jours internes (pilotage inclus)	Jours disponibles	Charge
Préparation	S1–S6	35,8	38,6	93 %
Socle et pilote	S7–S16	61,6	64,3	96 %
Migration des partenaires	S17–S34	112,0	115,8	97 %
Décommissionnement	S35–S38	22,4	25,7	87 %

A.3 Coût par phase, option A

Phase	Prestation	Achats	Contingence	Décaissé	Jours internes	Temps interne valorisé	Coût complet
Préparation	8,4	12,0	10 %	23,5	35,8	16,6	40,1
Socle et pilote	42,9	15,0	20 %	75,7	61,6	31,1	106,8
Migration des partenaires	43,2	0,0	25 %	60,5	112,0	58,9	119,4
Décommissionnement	3,6	2,0	15 %	6,9	22,4	10,8	17,8
Total	98,1			**166,6**	231,8	117,5	**284,1**

A.4 Coût sur trois ans après la décision, option A

k€ HT	Année 1	Année 2	Année 3	Total sur 3 ans
Décaissé projet	166,6	0,0	0,0	166,6
Décaissé récurrent (abonnement, support)	38,8	48,0	48,0	134,8
Décaissé	205,4	48,0	48,0	**301,4** (226,0 à 406,9)
Temps interne valorisé, projet	117,5	0,0	0,0	117,5
Temps interne valorisé, exploitation	9,5	35,2	35,2	79,9
Coût complet	332,4	83,2	83,2	**498,8** (374,1 à 673,4)
Décaissé évité	7,8	29,0	29,0	65,8
Décaissé net	197,6	19,0	19,0	**235,6**

A.5 Options comparées

Option	Décaissé engagé maintenant	Décaissé sur 3 ans	Coût complet sur 3 ans (fourchette)	Décaissé récurrent, année 2
A	99,2	301,4	498,8 (374,1 à 673,4)	48,0
B	229,9	286,9	525,7 (394,3 à 709,7)	19,0
0. Report d'un an	35,0	35,0 puis A décalé d'un an	non comparable	

A.6 Leviers d'économie, option A

Levier	Décaissé sur 3 ans	Coût complet sur 3 ans	Condition ou contrepartie	Qui décide
Renfort d'un ETP interne d'une autre équipe pendant la migration, à la place des 60 jours de l'intégrateur	-60,5	-22,4	Disponibilité de l'équipe prêteuse de S17 à S34	Sponsor
Engagement de trois ans sur l'abonnement (-10 %)	-12,1	-12,1	Sortie avant trois ans plus coûteuse	Achats
Réutilisation des machines virtuelles existantes pour l'agent interne	-7,2	-7,2	Capacité disponible confirmée par l'infrastructure	Infrastructure
